Ημερομηνία: 6-11-2026

Προσωρινή έκθεση ελέγχου

Θέμα: Έκτακτος, μερικός περιβαλλοντικός έλεγχος κατόπιν καταγγελίας σχετικά με τον Τοπικό Σταθμό Παραγωγής (Τ.Σ.Π.) Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμοργού, στα Κατάπολα ν. Αμοργού Ν. Κυκλάδων της Π.Ν.Αι., με φορέα του έργου την «Δ.Ε.Η. Α.Ε.»

Α. Σχετική Περιβαλλοντική Νομοθεσία - Αποφάσεις - Έγγραφα - Εκθέσεις Αυτοψίας ή Φύλλα Ελέγχου και λοιπά σχετικά στοιχεία/έγγραφα

1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α): «Για την προστασία του περιβάλλοντος»

2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α): «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος"

3. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/ΦΕΚ841/Β/2022: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης *«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471),* όπως έχει τροποποιηθεί και ως ισχύει

4. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α) και ειδικότερα το ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ αυτού: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ»

5. Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α) και ειδικότερα το Μέρος Δ΄ αυτού: «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

6. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/ΦΕΚ1530/Β/2024: «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»

7. Η υπ' αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 (ΑΔΑ ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) Εγκύκλιος: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»

8. Η με αρ. πρωτ. 1782/1484/3-2-2009 (ΟΕ: 23-3-2009) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, *περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου επέκτασης του Τοπικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΤΣΠ) της ΔΕΗ Αμοργού, υφιστάμενης ονομαστικής ισχύος 2,3807MW, με την εγκατάσταση τριών Η/Ζ ισχύος 3,825MW στον χώρο του ΤΣΠ για συνολική ονομαστική ισχύ 6,205MW, στη νήσο Αμοργό Νομού Κυκλάδων,* εκδοθείσα από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της (πρώην) Π.Ν.Αι.

9. Το με αρ. πρωτ. ΔΕΠΑΝ/Ε.Κ. 120017/5631/1-9-2025 έγγραφο της ΔΕΗ/ΔΕΠΑΝ περί ορισμού υπευθύνου τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων ΑΕΠΟ Σταθμών Παραγωγής της ΔΕΠΑΝ, μεταξύ των οποίων και του ΤΣΠ Αμοργού (αρ. πρωτ. εισερχ. 3253/9-9-2025)

10.Η από 16-9-2025 αυτοψία υπαλλήλου Γρ. Περιβάλλοντος του Τμ. Υποδομών & Περιβάλλοντος ΠΕ Νάξου της Π.Ν.Αι. στον ΤΣΠ Αμοργού στα Κατάπολα ν. Αμοργού

11. Το από 19-9-2025 (αρ. πρωτ. εισερχ. 3438/22-9-2025) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – υπόμνημα της ΔΕΗ Α.Ε. (διά κας Χαρίκλειας Τσερέπα) σχετικά με τον ΤΣΠ Αμοργού, με τα αναφερόμενα και τα κάτωθι συν/να σε αυτό: **α.** ημερολόγιο μετρήσεων εκπομπών αερίων ρύπων, **β.** ημερολόγιο εκπομπών θορύβου, **γ.** έγγραφο ΔΠΑΝ/2727/29.03.2017 περί υποβολής επικαιροποιημένου φακέλου για τη χορήγηση Άδειας

Λειτουργίας και την υπαγωγή του ΤΣΠ Αμοργού σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) και **δ.** έγγραφο ΔΕΠΑΝ/Ε.Κ. 46066/2147/28.03.2025 περί επανυποβολής αιτήματος για την έκδοση άδειας λειτουργίας και την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του ΤΣΠ Αμοργού

12.Το με αρ. πρωτ. 3284/25-2-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας μας: «*Διαβίβαση προσωρινής έκθεσης ελέγχου (η οποία καθίσταται οριστική) σχετικά με τον Τοπικό Σταθμό Παραγωγής (Τ.Σ.Π.) Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμοργού, στα Κατάπολα ν. Αμοργού Ν. Κυκλάδων της Π.Ν.Αι., με φορέα του έργου την «Δ.Ε.Η. Α.Ε.*», με συν/νη την από 12-2-2026 προσωρινή έκθεση ελέγχου με θέμα: «*Έκτακτος, μερικός περιβαλλοντικός έλεγχος κατόπιν καταγγελίας σχετικά με τον Τοπικό Σταθμό Παραγωγής (Τ.Σ.Π.) Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμοργού, στα Κατάπολα ν. Αμοργού Ν. Κυκλάδων της Π.Ν.Αι., με φορέα του έργου τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.*»

13. Το με αρ. πρωτ. 3021/8/828-α/29-7-2026 έγγραφο Α.Σ. Αμοργού (αρ. πρωτ. εισερχ. 2839/20-8-2026), με θέμα: «Καταγγελλόμενα για ηχορύπανση από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στα Κατάπολα Αμοργού», με συν/νη την από 27-7-2026 καταγγελία πολιτών

14.Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/89970/5003/11-8-2026 έγγραφο Τμ. Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του ΥΠΕΝ (αρ. πρωτ. εισερχ. 2763/12-8-2026), με θέμα: «Διαβίβαση αναφοράς σχετικά με ηχορύπανση που προκαλείται από τη λειτουργία ηλεκτρογεννητριών στα Κατάπολα της νήσου Αμοργού (Περ. Ενότητα Νάξου)», με συν/νη την από 27-7-2026 καταγγελία πολιτών

15.Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/90361/5039/27-8-2026 έγγραφο Τμ. Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του ΥΠΕΝ (αρ. πρωτ. εισερχ. 2941/27-8-2026), με θέμα: «Διαβίβαση καταγγελίας », με συν/νη εκ νέου την από 27-7-2026 καταγγελία πολιτών

16. Η από 15-9-2026 αυτοψία υπαλλήλου Γρ. Περιβάλλοντος του Τμήματος Υποδομών & Περιβάλλοντος ΠΕ Νάξου της Π.Ν.Αι. στον ΤΣΠ Αμοργού στα Κατάπολα ν. Αμοργού

17. Το από 12-10-2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ηλεκτρονική δ/νση: noreply.env.crime@prv.ypeka.gr (αρ. πρωτ. εισερχ. 3576/12-10-2026), με θέμα: «Διαβίβαση υπόθεσης», με συν/νη εκ νέου την από 27-7-2026 καταγγελία πολιτών

18. Το από 5-11-2026 (αρ. πρωτ. εισερχ. 3938/6-11-2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – υπόμνημα της «ΔΕΗ Α.Ε.» (διά κας Χαρίκλειας Τσερέπα) σχετικά με τον ΤΣΠ Αμοργού, με τα αναφερόμενα και τα συν/να σε αυτό

Β. Έγγραφα που προκάλεσαν τον έλεγχο

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατόπιν της από 27-7-2026 καταγγελίας πολιτών, συν/νης στα από (13) έως (15) σχετ. έγγραφα.

Γ. Στοιχεία ελέγχου

1. Ημερομηνία ελέγχου: 15 Σεπτεμβρίου 2026 και από ώρα περίπου 11:15π.μ.
2. Ονοματεπώνυμα επιθεωρητών/ελεγκτών: Αθηνά Σαντοριναίου, Βιολόγος -Π.Ε. Περιβάλλοντος, Αναπλ. Προϊσταμένη Γραφείου Περιβάλλοντος του Τμήματος Υποδομών και Περιβάλλοντος ΠΕ Νάξου της Π.Ν.Αι.
3. Τόπος ελέγχου: Τοπικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Κατάπολα ν. Αμοργού
4. Υπεύθυνος ελεγχόμενης δραστηριότητας: «ΔΕΗ Α.Ε.»

Δ. Σύντομη περιγραφή / Έλεγχος - Καταγραφή

Κατά τη διενέργεια της από 15-9-2026 αυτοψίας στον Τοπικό Σταθμό Παραγωγής (Τ.Σ.Π.) Ηλεκτρικής Ενέργειας της «ΔΕΗ Α.Ε.» που βρίσκεται σε εντός σχεδίου περιοχή στα Κατάπολα ν. Αμοργού, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σχετικά με τα αναφερόμενα στην από 27-7-2026 καταγγελία πολιτών. Κατά τον έλεγχο, εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. ήταν παρόντες: ο κ. Παναγιώτης Κιούσης – υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων του έργου, η κα Χαρά Τσερέπα – Τομεάρχης Προστασίας Περιβάλλοντος της ΔΕΠΑΝ και ο κ. Γεώργιος Ρούσσος – τοπικός υπεύθυνος.

Για το υπόψη έργο έχει εκδοθεί η υπ' αρ. πρωτ. με αρ. πρωτ. 1782/1484/3-2-2009 (ΟΕ: 23-3-2009) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, *περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου επέκτασης του Τοπικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΤΣΠ) της ΔΕΗ Αμοργού, υφιστάμενης ονομαστικής ισχύος 2,3807MW, με την εγκατάσταση τριών Η/Ζ ισχύος 3,825MW στον χώρο του ΤΣΠ για συνολική ονομαστική ισχύ 6,205MW, στη νήσο Αμοργό Νομού Κυκλάδων,* εκδοθείσα από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της (πρώην) Π.Ν.Αι. (διάρκεια ισχύος έως: 30-8-2018). Κατά δήλωση της κας Χαρίκλειας Τσερέπα, έχει υποβληθεί εμπρόθεσμο αίτημα (υπ' αρ. πρωτ. ΔΕΠΑΝ/Ε.Κ. 46066/2147/28.03.2025) για την ενσωμάτωση Π.Π.Δ. σε αίτηση χορήγησης αυτοτελούς άδειας λειτουργίας του έργου, σε συνέχεια της υπ' αρ. πρωτ. ΔΠΑΝ/2727/29-3-2017 αίτησης της «ΔΕΗ ΑΕ» ενώ πρόκειται να υποβληθεί εκ νέου σχετικό αίτημα.

Κατά τον έλεγχο κατεγράφησαν τα κάτωθι:

- Σχετικά με τα καταγγελλόμενα που αφορούν στις εξωτερικές, φορητές μονάδες Η/Ζ στον προαύλιο χώρο του Τ.Σ.Π.: υφίσταται φορητό Η/Ζ, ιδιοκτησίας της «ΔΕΗ Α.Ε.», τύπου MITSUBISHI, το οποίο ζητήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία. Το Η/Ζ είναι εντός ηχομονωτικού κλωβού και σε σχέση με τον (10) σχετ. προηγούμενο έλεγχο της Υπηρεσίας μας (έτους 2025) διαπιστώθηκε ότι έχουν υλοποιηθεί πρόσθετες ενέργειες ηχομείωσης και συγκεκριμένα τοποθέτηση ηχομονωτικών panels σε σημεία εκπομπής θορύβου (σε εξάτμιση και ψυγεία).
- Επίσης, υφίσταται <u>αποσυνδεδεμένο</u> φορητό Η/Ζ τύπου MTU, ισχύος 2MW, για το οποίο έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. Ε-69/2026 Απόφαση της ΡΑΑΕΥ (ΑΔΑ: ΡΚΠΥΙΔΞ-9ΤΡ) με θέμα: «*Χορήγηση άδειας παραγωγής στη ΔΕΗ Α.Ε. για τη μίσθωση Η/Ζ συνολικής ισχύος 2 MW για τη διασφάλιση ισχύος στο μη διασυνδεδεμένο νησί της Αμοργού για το θέρος του 2026*», με ημερομηνία έναρξης άδειας παραγωγής: 1-7-2026 και ημερομηνία λήξης αυτής: 31-8-2026. Το Η/Ζ βρίσκεται εντός ηχομονωτικού κλωβού και από τη ΔΕΗ Α.Ε. έχουν τοποθετηθεί ηχομονωτικά panels, με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου (κατά δήλωση της κας Χ. Τσερέπα). Υπήρξε ενημέρωση ότι το συγκεκριμένο Η/Ζ λειτούργησε μέχρι τέλη Ιουλίου 2026 ενώ τον Αύγουστο 2026 τέθηκε σε λειτουργία μόνο για τη διενέργεια ηχομετρήσεων εκπομπής θορύβου και τα σχετικά έγγραφα – ημερολόγιο εκπομπών θορύβου έτους 2026 θα αποσταλούν στην Υπηρεσία μας.
- Εσωτερικά στο κτίριο, εντός του μηχανοστασίου υφίστανται 3 ενεργές μονάδες βάσεις (Η/Ζ) τύπου MITSUBISHI, εκ των οποίων οι δύο (2) ήταν σε λειτουργία κατά τον χρόνο του ελέγχου. Τα υπόψη Η/Ζ είναι ηχομονωμένα, έκαστο εντός μεταλλικής κατασκευής. Κάθε ένα εκ των τριών

ενεργών Η/Ζ διαθέτει μία καμινάδα με ηχομονωτικό περίβλημα. Σε σχετικό ερώτημα, υπήρξε ενημέρωση ότι εκκρεμεί αντικατάσταση των σιγαστήρων των καμινάδων (για τις μονάδες βάσεις) στα πλαίσια έργων αναβάθμισης του Τ.Σ.Π. Αμοργού.

- Το καύσιμο που χρησιμοποιείται στον Τ.Σ.Π. Αμοργού είναι diesel. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε έκλυση καπνού από τις καμινάδες των δύο ενεργών (εν λειτουργία) μονάδων βάσης. Ζητήθηκαν πρόσφατες μετρήσεις (έτους 2026) αερίων ρύπων και υπήρξε ενημέρωση ότι θα αποσταλούν άμεσα στην Υπηρεσία μας.
- Στον προαύλιο χώρο του Τ.Σ.Π. διαπιστώθηκε ότι έχουν τοποθετηθεί ηχομονωτικά panels στη Ν-ΝΑ πλευρά της περίφραξης.
- Σύμφωνα με την κα Χ. Τσερέπα, έχει υπογραφεί σύμβαση για την αποξήλωση δύο μονάδων βάσης (τύπου Sulzer) που δεν λειτουργούν σήμερα και βρίσκονται εσωτερικά του μηχανοστασίου και θα εξεταστεί η ενίσχυση ισχύος του Σταθμού εντός του μηχανοστασίου.

Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε έλεγχος εκπομπών θορύβου από τη λειτουργία των δύο (2) Η/Ζ (μονάδων βάσης) του Τ.Σ.Π. Αμοργού, που ήταν σε λειτουργία κατά τον χρόνο του παρόντος ελέγχου, καθώς και από τη λειτουργία του φορητού Η/Ζ του Τ.Σ.Π. Αμοργού. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι δύο εν λειτουργία μονάδες ήταν εγκατεστημένες εντός του μηχανοστασίου του κτιρίου και έκαστη ηχομονωμένη εντός ξεχωριστής μεταλλικής κατασκευής. Το δε φορητό Η/Ζ βρισκόταν εντός ηχομονωτικού κλωβού, στον προαύλιο χώρο του Τ.Σ.Π.

Η μέτρηση των εκπεμπόμενων επιπέδων θορύβου πραγματοποιήθηκε με το ηχόμετρο (μοντέλο SVAN971) της ΔΙ.ΠΕ.ΒΙ. της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, το οποίο βαθμονομήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας του (114,1db). Πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) ηχομετρήσεις:

- **1η ηχομέτρηση:** έγινε χωρίς την πηγή θορύβου από τις δύο μονάδες βάσης (Η/Ζ) και χωρίς την πηγή θορύβου από το φορητό Η/Ζ του Τ.Σ.Π. Αμοργού. Η ηχομέτρηση πραγματοποιήθηκε εκτός ορίων του Τ.Σ.Π., σε απόσταση περί τα 50μ. (σε νοητή ευθεία) από την κεντρική είσοδο του Τ.Σ.Π. ώστε να καταγραφεί ο θόρυβος βάθους, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν ήταν δυνατή η διακοπή λειτουργίας των Η/Ζ (μη διασυνδεδεμένη η ν. Αμοργός).
- **2η ηχομέτρηση:** έγινε με πηγή θορύβου τις δύο μονάδες βάσης (Η/Ζ) του Τ.Σ.Π. Αμοργού και πραγματοποιήθηκε στην κεντρική είσοδο του Τ.Σ.Π.
- **3η ηχομέτρηση:** έγινε με πηγή θορύβου το φορητό Η/Ζ του Τ.Σ.Π. Αμοργού και πραγματοποιήθηκε στην κεντρική είσοδο του Τ.Σ.Π.

Αποτελέσματα 1ης ηχομέτρησης:

Η ηχομέτρηση πραγματοποιήθηκε για χρονικό διάστημα 5 λεπτών χωρίς να υπάρχει η πηγή θορύβου από τη λειτουργία των δύο μονάδων βάσης (Η/Ζ) και του φορητού Η/Ζ του Τ.Σ.Π., ώστε μέσω του Laf95 και της μέτρησης των λοιπών παραμέτρων να καταγραφεί ο Θόρυβος βάθους (Θβ). Κατά τη διάρκεια της μέτρησης της καταγράφηκε **Laf95 = 54,3dB**, τιμή η οποία -σύμφωνα με τη βιβλιογραφία- λαμβάνεται ως μέση στάθμη θορύβου βάθους.

Αποτελέσματα 2ης ηχομέτρησης:

Η ηχομέτρηση πραγματοποιήθηκε για χρονικό διάστημα 2 λεπτών με πηγή θορύβου τις δύο μονάδες βάσης (Η/Ζ) του Τ.Σ.Π. Ως ολικός θόρυβος στο σημείο ηχομέτρησης λαμβάνεται η μέγιστη επαναλαμβανόμενη καταγραμμένη τιμή, από αυτές που μετράει το όργανο (για χρονικό διάστημα 2 λεπτών – σταθερή λειτουργία των μηχανημάτων της επιχείρησης), η οποία στην παρούσα περίπτωση εκτιμήθηκε στα επίπεδα του **LAF(ολ) = 56,5dB**. Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία υπολογισμού του θορύβου της πηγής με τη χρήση του διορθωτικού πίνακα αφαίρεσης dB [σε περιπτώσεις της τη παρούσα, όπου το όργανο καταγράφει συνολική εκπομπή θορύβου (βάθους και πηγής)] και με τη χρήση των σχετικών διαγραμμάτων (Difference Between Aggregate and Background) προκύπτει ότι **η διαφορά ολικού θορύβου [LAF(ολ)] και θορύβου βάθους (Laf95) είναι: 56,5dB – 54,3dB = 2,2dB**. Ανάγοντας αυτή τη διαφορά στο διορθωτικό πίνακα αφαίρεσης προκύπτει **διορθωτικό ποσό προσδιορισμού (L πηγής) σε dB(A): 4,1dB**. Αφαιρώντας το ποσό αυτό από τον ολικό θόρυβο προκύπτει **θόρυβος πηγής στο σημείο αυτό: (56,5 – 4,1)dB = 52,4dB.**

Αποτελέσματα 3ης ηχομέτρησης:

Η ηχομέτρηση πραγματοποιήθηκε για χρονικό διάστημα 2 λεπτών με πηγή θορύβου το φορητό Η/Ζ του Τ.Σ.Π. Ως ολικός θόρυβος στο σημείο ηχομέτρησης λαμβάνεται η μέγιστη επαναλαμβανόμενη καταγραμμένη τιμή, από αυτές που μετράει το όργανο (για χρονικό διάστημα 2 λεπτών – σταθερή λειτουργία των μηχανημάτων της επιχείρησης), η οποία στην παρούσα περίπτωση εκτιμήθηκε στα επίπεδα του **LAF(ολ) = 56,5dB**. Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία υπολογισμού του θορύβου της πηγής με τη χρήση του διορθωτικού πίνακα αφαίρεσης dB [σε περιπτώσεις της τη παρούσα, όπου το όργανο καταγράφει συνολική εκπομπή θορύβου (βάθους και πηγής)] και με τη χρήση των σχετικών διαγραμμάτων (Difference Between Aggregate and Background) προκύπτει ότι **η διαφορά ολικού θορύβου [LAF(ολ)] και θορύβου βάθους (Laf95) είναι: 56,5dB – 54,3dB = 2,2dB**. Ανάγοντας αυτή τη διαφορά στο διορθωτικό πίνακα αφαίρεσης προκύπτει **διορθωτικό ποσό προσδιορισμού (L πηγής) σε dB(A): 4,1dB**. Αφαιρώντας το ποσό αυτό από τον ολικό θόρυβο προκύπτει **θόρυβος πηγής στο σημείο αυτό: (56,5 – 4,1)dB = 52,4dB.**

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α/6-10-1981), για τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό και το αστικό στοιχείο, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου καθορίζεται στα 55dbA, μετρούμενο επί του ορίου του ακινήτου επί του οποίου κείται η εγκατάσταση. Σύμφωνα δε με τον Περιβαλλοντικό Όρο (Π.Ο.) Β2 της υπ' αρ. πρωτ. 1782/1484/3-2-2009 (ΟΕ: 23-3-2009) Α.Ε.Π.Ο., στα όρια του γηπέδου του Τ.Σ.Π., το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 65dB(A) (Π.Δ. 1180/81/ΦΕΚ 293/Α/81).

Από τα παραπάνω δεν προκύπτει υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου από τη λειτουργία των δύο μονάδων βάσης (Η/Ζ) και του φορητού Η/Ζ του Τοπικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ ν. Αμοργού που βρίσκεται εντός ορίων του οικισμού «Κατάπολα» ν. Αμοργού.

Σε συνέχεια της από 15-9-2026 αυτοψίας, υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας [με το (18) σχετ.], τα εξής στοιχεία και έγγραφα:

1. ημερολόγιο μετρήσεων εκπομπών αερίων ρύπων της τελευταίας εξαετίας (2021–2026),

2. ημερολόγιο καταγραφής και παρακολούθησης των μετρήσεων στάθμης εκπεμπόμενου θορύβου, συμπεριλαμβανομένων των μετρήσεων έτους 2026,

3. έγγραφο ΔΠΑΝ/2727/29.03.2017 υποβολής επικαιροποιημένου φακέλου για τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας και δήλωση υπαγωγής του ΤΣΠ Αμοργού σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) και έγγραφο ΔΕΠΑΝ/Ε.Κ. 46066/2147/28.03.2025 επανυποβολής αιτήματος για την έκδοση άδειας λειτουργίας και δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ του ΤΣΠ Αμοργού,

4. σελίδες του Νόμου 5264 (ΦΕΚ Α' 239/19.12.2025), με το Άρθρο 122 περί Παρατάσεων προσωρινών αδειών λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε.,

5. σελίδες που αφορούν το Ηλεκτρικό Σύστημα Αμοργού από το πρόσφατο επταετές Πρόγραμμα ανάπτυξης Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών 2025-2031 του Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ).,

6. η άδεια παραγωγής του ενοικιαζόμενου φορητού του ΤΣΠ Αμοργού,

7. επιστολή ΔΕΠΑΝ στον Ανάδοχο μίσθωσης του ενοικιαζόμενου φορητού Η/Ζ και Επίσημη αλληλογραφία του Διευθυντή Κλάδου Εκμετάλλευσης και Τεχνικής Υποστήριξης ΔΕΠΑΝ με το Διαχειριστή,

8. υπόμνημα, στο οποίο διευκρινίζονται τα εξής: «Ο *ΤΣΠ οφείλει να τηρεί ημερολόγιο εκπομπών αερίων ρύπων και θορύβου, τα οποία και επισυνάπτονται συμπληρωμένα με τις μετρήσεις του τρέχοντος έτους. Αναφορικά με την αδειοδότηση του Σταθμού: 1. Η δραστηριότητα του ΤΣΠ Αμοργού κατατάσσεται στην 9η Ομάδα, α/α 2, Κατηγορία Β, βάσει της ΥΑ 17185/1069/22 (ΦΕΚ 841 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει. 2. Ο Σταθμός διαθέτει Προσωρινή Ενιαία Άδεια Λειτουργίας, η οποία παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με τη νέα παράταση (μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026) που δόθηκε μετά την έκδοση του συνημμένου Νόμου 5264 (ΦΕΚ Α' 239/19.12.2025). Διευκρινίζεται ότι με το διαβιβαστικό έγγραφο ΔΠΑΝ/2727/29.03.2017 υποβλήθηκε τεχνικός φάκελος για την έκδοση άδειας λειτουργίας και υπαγωγής σε ΠΠΔ ενώ με τη με αρ. Πρωτ. Αρ. ΔΕΠΑΝ/Ε.Κ.*

46066/2147/28.03.2025 επιστολή, η ΔΕΗ Α.Ε. επανήλθε εκ νέου στο αίτημα έκδοσης αυτοτελούς άδειας λειτουργίας και δήλωσης υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του ΤΣΠ, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 3. Η ΑΕΠΟ του ΤΣΠ παραμένει σε ισχύ λόγω εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 7, §2, της υπ' Αριθμ. 45964 ΥΑ (ΦΕΚ 1987/14.08.2013), οι δραστηριότητες που υπάγονται σε ΠΠΔ και διαθέτουν ΑΕΠΟ, θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας ΑΕΠΟ τους. Ως εκ τούτου, η Επιχείρηση είχε προβεί σε εμπρόθεσμη υποβολή των αιτημάτων δήλωσης υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του ΤΣΠ Αμόργου, πολύ πριν τη λήξη των όρων της ΑΕΠΟ του Σταθμού και συγκεκριμένα ήδη από το 2017, σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο (ΔΠΑΝ/2727/29.03.2017), λαμβάνοντας επιπλέον υπ' όψιν ότι η ημερομηνία λήξης των όρων της ΑΕΠΟ του Σταθμού είναι στις 30.08.2018. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. 2δ του Άρθρου 122 του Νόμου 5264 (ΦΕΚ Α' 239/19.12.2025), οι Σταθμοί παραγωγής που κατατάσσονται στη Β' Κατηγορία όπως στην προκειμένη περίπτωση ο ΤΣΠ Αμοργού, υπάγονται αυτοδίκαια στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της υπ' αρ. 45964/2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 1987), όπως εκάστοτε ισχύει. Επισημαίνεται ότι από πλευράς ΔΕΗ καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια μείωσης της στάθμης του εκπεμπόμενου θορύβου ενόψει της επικείμενης εγκατάστασης του ενοικιαζόμενου ΗΖ κατά την περίοδο αιχμής θέρους 2026. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι υλοποιήθηκαν έργα ηχομείωσης με εγκατάσταση ηχοαπορροφητικών πάνελ στα όρια περίφραξης του Σταθμού, τοποθετήθηκαν ηχοαπορροφητικά πάνελ -με τη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου- στους ανεμιστήρες και στην έξοδο των καυσαερίων του ενοικιαζόμενου Η/Ζ, κ.ά. Όπως προκύπτει από τη συνημμένη επιστολή ΔΕΠΑΝ διενεργήθηκαν διερευνητικές μετρήσεις εντός λίγων ημερών από την έναρξη λειτουργίας του υπόψη φορητού και ενημερώθηκε ο Ανάδοχος ότι θα πρέπει να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις Συμβατικά επιτρεπόμενες τιμές θορύβου. Μετά τη διενέργεια των μετρήσεων αυτών, ενημερώθηκε αντίστοιχα και ο Διαχειριστής ότι η υπόψη ενοικιαζόμενη Μονάδα τίθεται εκτός λειτουργίας αλλά παραμένει στο Σταθμό, αποκλειστικά για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων καταστάσεων (βλ. συνημμένη επίσημη αλληλογραφία με το Διαχειριστή)».

Επισυνάπτονται φωτογραφίες που ελήφθησαν κατά τη διενέργεια της από 15-9-2026 αυτοψίας.

Ε. Διαπιστωμένες ελλείψεις συμμόρφωσης

Από τα σημεία ελέγχου που επιθεωρήθηκαν κατά τη διενέργεια της από 15-9-2026 αυτοψίας σχετικά με τα καταγγελλόμενα που αφορούν στον Τοπικό Σταθμό Παραγωγής (Τ.Σ.Π.) Ηλεκτρικής Ενέργειας της Δ.Ε.Η. Αμοργού που βρίσκεται στα Κατάπολα ν. Αμοργού Ν. Κυκλάδων της Π.Ν.Αι., με φορέα του έργου την «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα διευκρινιστικά στοιχεία και έγγραφα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας με το (18) σχετ., δεν στοιχειοθετήθηκαν συναφή στοιχεία υποβάθμισης περιβάλλοντος ή συναφείς ελλείψεις συμμόρφωσης σχετικά με τα

καταγγελλόμενα κατά τον χρόνο του παρόντος ελέγχου. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 20 – παρ.11β. του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), ως ισχύει, η παρούσα προσωρινή έκθεση ελέγχου καθίσταται οριστική.

Η επιθεωρήτρια / ελέγκτρια

ATHINA SANTORINAIOU
06/11/2026 08:17

ΑΘΗΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
(ημερομηνία λήψης: 15-9-2026)







ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
(ημερομηνία λήψης: 15-9-2026)







ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
(ημερομηνία λήψης: 15-9-2026)








ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
(ημερομηνία λήψης: 15-9-2026)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
(ημερομηνία λήψης: 15-9-2026)



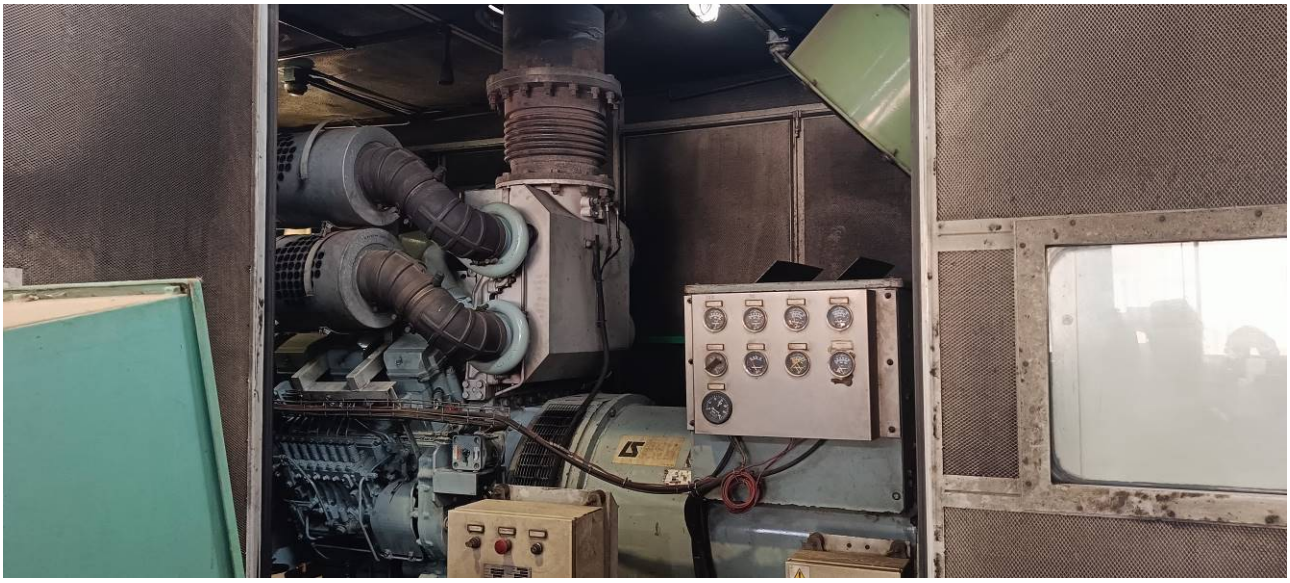

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
(ημερομηνία λήψης: 15-9-2026)



